


**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
PLAN DE ARBITRIOS MUNICIPALES
Cierre de Ejercicio 2007**

Hoja 1 de
Fecha de Elaboración: 29/11/2007



MUNICIPIO: VERACRUZ

FONDO:

Programa		Metas Totales																					
SubPrograma		Alcaldía																					
No.Obra	Nombre de la Obra	Localidad					*Situac	Mod. Ejec.	U. Medida	Progr	Reservaciones												
Avances Físicos		Avances Financieros		Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldo									
Fechas Reales		Fechas Reales		Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes			
%	Inicio	Término	%																		Inicio	Término	

(IR) INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL

(04) PESQUERO Y ACUÍCOLA

20071991010	CONSTRUCCION DE MUELLE Y EMBARCADERO EN LA FORTALEZA DE SAN JUAN DE ULUA	VERACRUZ					TR	C	EMBARCADERO	1.00	1.00										
100	29/03 17/04	100	12/07 12/07	336,516.54	0.00	0.00	336,516.54	0.00	0.00	336,516.54	0.00	0.00	336,516.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa:				336,516.54	0.00	0.00	336,516.54	0.00	0.00	336,516.54	0.00	0.00	336,516.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL

(01) REHABILITACIÓN

20071991041	REHABILITACION DE LA VIALIDAD DE LA COLONIA AMAPOLAS II	VERACRUZ					TR	C	METRO CUADRADO	5,666.00	5,666.00										
100	02/07 14/08	100	25/09 22/11	1,219,794.39	0.00	0.00	1,219,794.39	0.00	0.00	1,219,794.39	0.00	0.00	1,219,794.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20071991039	REHABILITACION DE BANQUETAS Y ANDADORES EN LA GLORIETA "LA VITAMINA" EN EL INFONAVIT BUENAVISTA	VERACRUZ					TR	C	METRO CUADRADO	327.00	327.00										
100	06/09 25/09	100	06/11 06/11	149,506.83	0.00	0.00	149,506.83	0.00	0.00	149,506.83	0.00	0.00	149,506.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20071991011	REHABILITACION DE LOS CAMELONES DEL PASEO MARTI ENTRE AV. ERNESTO DOMINGUEZ Y AV. ESPAÑA FRACC. REFORMA (2a ETAPA)	VERACRUZ					TR	C	METRO CUADRADO	800.00	800.00										
100	01/04 17/04	100	27/07 27/07	344,814.85	0.00	0.00	344,814.85	0.00	0.00	344,814.85	0.00	0.00	344,814.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(02) CONSTRUCCIÓN

20071991016	CONSTRUCCION DE ACCESOS Y ANDADORES EN PASEO MARTI FRACC. REFORMA	VERACRUZ					TR	C	METRO CUADRADO	1,982.00	1,982.00										
100	02/04 19/04	100	08/10 08/10	827,998.91	0.00	0.00	827,998.91	0.00	0.00	827,998.91	0.00	0.00	827,998.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20071991012	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLENDE EN LA CIUDAD DE VERACRUZ	VERACRUZ					TR	C	METRO LINEAL	615.05	615.05										
100	02/01 17/09	100	02/03 14/11	46,979,435.98	0.00	0.00	46,979,435.98	0.00	0.00	46,979,435.98	0.00	0.00	46,979,435.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa:				49,521,550.96	0.00	0.00	49,521,550.96	0.00	0.00	49,521,550.96	0.00	0.00	49,521,550.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(U9) GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION

(01) GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN

20071991028	SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS DE APOYO TECNICO NORMATIVO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL EN LOS PROCESOS DE LICITACION DURANTE EL EJERCICIO 2007	VERACRUZ					TR	C	PAGO	1.00	1.00										
100	01/07 15/07	100	26/07 26/07	15,182.56	0.00	0.00	15,182.56	0.00	0.00	15,182.56	0.00	0.00	15,182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20071991027	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE OBRAS RP	VERACRUZ					TR	C	PAGO	1.00	1.00										
100	15/05 30/11	100	19/09 30/11	184,690.59	0.00	0.00	184,690.59	0.00	0.00	184,690.59	0.00	0.00	184,690.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Situación de Obra
TR = Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Sin Iniciar

AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JULÉN REMENTERIA DEL PUERTO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION
Trabajando por el Puerto que queremos


CONTRALORIA MUNICIPAL
C.P. JESUS SUVERZA MEDINA
CONTRALOR MUNICIPAL
Trabajando por el Puerto que queremos

C.P.C. ANALORENA OROPEZA TALAVERA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
TESORERIA MUNICIPAL

**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
PLAN DE ARBITRIOS MUNICIPALES
Cierre de Ejercicio 2007**

Hoja 2 de
Fecha de Elaboración: 27/11/2007



MUNICIPIO: VERACRUZ

FONDO:

Programa		Nombre de la Obra															Localidad		*Situac	Mod. Ejec.	U. Medida	Progr		Metas Totales	Observaciones		
SubPrograma																											
No.Obra																											
Avances Fisicos		Avances Financieros		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Saldo											
Fechas Reales		Fechas Reales		Total		Federal		Estatal		Municipal		Participantes		Otros		Total		Federal		Estatal		Municipal		Participantes		Otros	
%	Inicio	Término	%	Inicio	Término																						

(U9) GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION

Programa:	199,873.15	0.00	0.00	199,873.15	0.00	0.00	199,873.15	0.00	0.00	0.00	199,873.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(UM) EQUIPAMIENTO URBANO

(01) REHABILITACIÓN


20071991029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LAGUNA DEL ENCANTO EN LA U. HAB. EL COYOL	VERACRUZ	TR	AD	OBRA	1.00	1.00																			
100	12/06 12/06 100 12/06 12/06 1,641,535.87	0.00	0.00	1,641,535.87	0.00	0.00	1,641,535.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20071991034	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL PALACIO MUNICIPAL	VERACRUZ	TR	C	OBRA	1.00	1.00																			
100	30/07 20/08 100 26/11 26/11 845,584.80	0.00	0.00	845,584.80	0.00	0.00	845,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20071991014	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE LA COL. CENTRO	VERACRUZ	TR	C	OBRA	1.00	1.00																			
100	16/08 20/09 100 16/08 24/11 1,379,952.64	0.00	0.00	1,379,952.64	0.00	0.00	1,379,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(02) CONSTRUCCIÓN

20071991040	TERMINACION DEL NUEVO MERCADO DE PESCADERIA EN LA COLONIA MIGUEL ALEMAN	VERACRUZ	TR	C	OBRA	0.30	0.30																			
100	02/01 04/03 100 11/04 13/11 12,494,936.72	0.00	0.00	12,494,936.72	0.00	0.00	12,494,936.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20071991017	CONSTRUCCION DE LOCALES PARA REUBICACION PROVISIONAL DE LA PLAZA GASTRONOMICA DEL ANTIGUO MERCADO DE PESCADERIA EN LA PLAZA LA CONCORDIA	VERACRUZ	TR	C	OBRA	1.00	1.00																			
100	02/04 01/05 100 23/08 23/08 551,381.38	0.00	0.00	551,381.38	0.00	0.00	551,381.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20071991032	CONSTRUCCION DE MONUMENTO AL MAGISTERIO EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON	VERACRUZ	TR	C	OBRA	1.00	1.00																			
100	23/08 11/09 100 25/10 26/10 293,107.51	0.00	0.00	293,107.51	0.00	0.00	293,107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20071991038	CONSTRUCCION PARA LA REUBICACION DE LA FUENTE DE LOS NIÑOS TRAVIEGOS EN LA AVENIDA ALLENDE NORTE	VERACRUZ	TR	C	OBRA	1.00	1.00																			
100	09/11 26/11 100 26/11 26/11 701,954.05	0.00	0.00	701,954.05	0.00	0.00	701,954.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20071991020	ALIMENTACION ELÉCTRICA A LOCALES DE REUBICACIÓN PROVISIONAL DEL MERCADO DE PESCADERIA COL. CENTRO	VERACRUZ	TR	C	OBRA	1.00	1.00																			
100	20/03 29/03 100 11/04 11/04 339,287.28	0.00	0.00	339,287.28	0.00	0.00	339,287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa:	18,247,740.25	0.00	0.00	18,247,740.25	0.00	0.00	18,247,740.25	0.00	0.00	0.00	18,247,740.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------	---------------	------	------	---------------	------	------	---------------	------	------	------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Municipio:	68,305,680.90	0.00	0.00	68,305,680.90	0.00	0.00	68,305,680.90	0.00	0.00	0.00	68,305,680.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	---------------	------	------	---------------	------	------	---------------	------	------	------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------





JULEN REMENTERIA DEL PUERTO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Situación de Obra

TR = Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Sin Ejecutar, CA = Cancelada

C.P. JESUS SUVERZA MEDINA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.C. ANALORENA OROPEZA TALAVERA
TESORERO MUNICIPAL






ORG O DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
PLAN DE ARBITRIOS MUNICIPALES
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2007
OFICIO DE MODIFICACION N°: 200730199007

Página 1 de 2

Fecha de Elaboración: 29-Nov-07

Municipio: VERACRUZ

Programa		Modalidad de Ejecución																Metas										
Sub Programa		Programada								Modificada								Inversión Modificada										
Num. Obra	Descripción de la Obra	Localidad				Programada				Modificada				Fechas Programadas				Fechas Modificadas				Unidad de Medida	Aprobadas	Ampliadas	Redu- cidas	Modifi- cadas		
Inversión Aprobada						Reducciones						Ampliaciones						Inversión Modificada										
Suma	Federal	Estatal	Mpal.	Particip.	Otros	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	Particip.	Otros	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	Particip.	Otros	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	Particip.	Otros					
(BM) BIENES MUEBLES																												
(01) Adquisiciones																												
20071991033	ADQUISICION DE UNA ASTILLADORA DE TRONCOS	VERACRUZ				ADMINISTRACION DIRECTA				ADMINISTRACION DIRECTA				01/06/2007 01/06/2007								LOTE	0.00	0.00	0.00	0.00		
401,350.00	0.00	0.00	401,350.00	0.00	0.00	401,350.00	0.00	0.00	401,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401,350.00	0.00	0.00	401,350.00	0.00	0.00	401,350.00	0.00	0.00	401,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(SE) URBANIZACION MUNICIPAL																												
(01) Rehabilitación																												
20071991039	REHABILITACION DE BANQUETAS Y ANDADORES EN LA GLORIETA "LA VITAMINA" EN EL INFONAVIT BUENAVISTA	VERACRUZ				CONTRATO				CONTRATO				05/09/2007 31/12/2007 06/09/2007 25/09/2007				METRO CUADRADO	327.00	0.00	0.00	327.00						
149,907.39	0.00	0.00	149,907.39	0.00	0.00	400.56	0.00	0.00	400.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,506.83	0.00	0.00	149,506.83	0.00	0.00	0.00	0.00			
20071991041	REHABILITACION DE LA VIALIDAD DE LA COLONIA AMAPOLAS II	VERACRUZ				CONTRATO				CONTRATO				05/09/2007 31/12/2007 02/07/2007 14/08/2007				METRO CUADRADO	5,800.00	0.00	-134.00	5,666.00						
1,219,794.40	0.00	0.00	1,219,794.40	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,794.39	0.00	0.00	1,219,794.39	0.00	0.00	0.00	0.00			
(02) Construcción																												
20071991012	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLENDE EN LA CIUDAD DE VERACRUZ	VERACRUZ				CONTRATO				CONTRATO				01/01/2007 30/08/2007 02/01/2007 17/09/2007				METRO LINEAL	615.05	0.00	0.00	615.05						
50,727,818.63	0.00	0.00	50,727,818.63	0.00	0.00	3,748,382.65	0.00	0.00	3,748,382.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,979,435.98	0.00	0.00	46,979,435.98	0.00	0.00	0.00	0.00			
20071991016	CONSTRUCCION DE ACCESOS Y ANDADORES EN PASEO MARTI FRACC. REFORMA	VERACRUZ				CONTRATO				CONTRATO				05/03/2007 05/06/2007 02/04/2007 19/04/2007				METRO CUADRADO	2,000.00	0.00	-18.00	1,982.00						
827,998.91	0.00	0.00	827,998.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,998.91	0.00	0.00	827,998.91	0.00	0.00	0.00	0.00			
20071991036	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR DEL BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ	VERACRUZ				CONTRATO				CONTRATO				01/03/2007 20/08/2007				METRO LINEAL	461.91	0.00	-461.91	0.00						
3,383,053.52	0.00	0.00	3,383,053.52	0.00	0.00	3,383,053.52	0.00	0.00	3,383,053.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,176,736.11	0.00	0.00	49,176,736.11	0.00	0.00	0.00	0.00			
56,308,572.85	0.00	0.00	56,308,572.85	0.00	0.00	7,131,836.74	0.00	0.00	7,131,836.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,176,736.11	0.00	0.00	49,176,736.11	0.00	0.00	0.00	0.00			
(U9) GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION																												
(01) Gastos Indirectos para Supervisión																												
20071991027	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE OBRAS RP	VERACRUZ				CONTRATO				CONTRATO				04/07/2007 31/12/2007 15/05/2007 30/11/2007				PAGO	1.00	0.00	0.00	1.00						
233,732.65	0.00	0.00	233,732.65	0.00	0.00	49,042.06	0.00	0.00	49,042.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,690.59	0.00	0.00	184,690.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
233,732.65	0.00	0.00	233,732.65	0.00	0.00	49,042.06	0.00	0.00	49,042.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,690.59	0.00	0.00	184,690.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
(UM) EQUIPAMIENTO URBANO																												
(01) Rehabilitación																												
20071991034	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	VERACRUZ				CONTRATO				CONTRATO				04/07/2007 30/09/2007 30/07/2007 20/08/2007				OBRA	1.00	0.00	0.00	1.00						
868,269.09	0.00	0.00	868,269.09	0.00	0.00	22,684.29	0.00	0.00	22,684.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,584.80	0.00	0.00	845,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
(02) Construcción																												

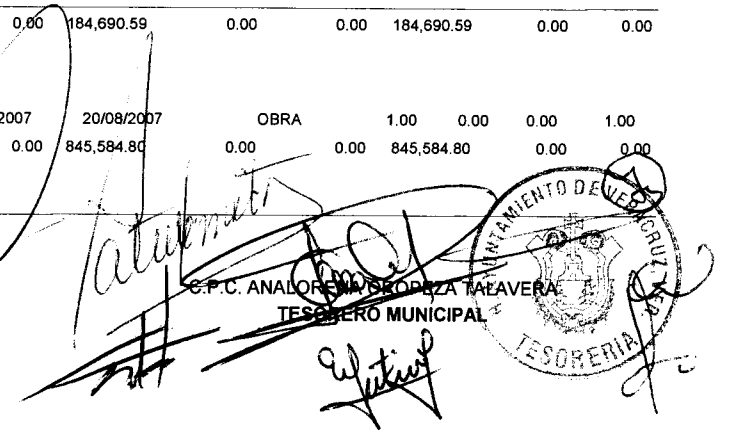

C.P. JESUS SUVERZA MEDINA
CONTRALOR MUNICIPAL


C.P.C. ANALORENA SUVERZA TALAVERA
TESORERO MUNICIPAL

ORG O DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
PLAN DE ARBITRIOS MUNICIPALES
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2007
OFICIO DE MODIFICACION N°: 200730199007



Municipio: VERACRUZ


Programa		Modalidad de Ejecución																				Metas								
Sub Programa		Programada										Modificada										Aprobadas		Ampliadas		Modificadas				
Num. Obra	Descripción de la Obra	Localidad					Programada					Modificada					Inicio	Término	Inicio	Término	Unidad de Medida	Aprobadas	Ampliadas	Modificadas						
Inversión Aprobada						Reducciones						Ampliaciones						Inversión Modificada												
Suma	Federal	Estatal	Mpal.	Particip.	Otros	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	Particip.	Otros	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	Particip.	Otros	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	Particip.	Otros							
(UM) EQUIPAMIENTO URBANO																														
(02) Construcción																														
20071991032	CONSTRUCCION DE MONUMENTO AL MAGISTERIO EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON	VERACRUZ					CONTRATO					CONTRATO					04/07/2007	30/10/2007	23/08/2007	11/09/2007	OBRA	1.00	0.00	0.00	1.00					
297,213.76	0.00	0.00	297,213.76	0.00	0.00	4,106.25	0.00	0.00	4,106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,107.51	0.00	0.00	293,107.51	0.00	0.00	
20071991038	CONSTRUCCION PARA LA REUBICACION DE LA FUENTE DE LOS NIÑOS TRAVESOS EN LA AVENIDA ALLENDE NORTE	VERACRUZ					CONTRATO					CONTRATO					05/09/2007	31/12/2007	09/11/2007	26/11/2007	OBRA	1.00	0.00	0.00	1.00					
850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	148,045.95	0.00	0.00	148,045.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,954.05	0.00	0.00	701,954.05	0.00	0.00	
20071991040	TERMINACION DEL NUEVO MERCADO DE PESCADERIA EN LA COLONIA MIGUEL ALEMAN	VERACRUZ					CONTRATO					CONTRATO					18/02/2007	18/07/2007	02/01/2007	04/03/2007	OBRA	0.30	0.00	0.00	0.30					
3,355,194.02	0.00	0.00	3,355,194.02	0.00	0.00	860,257.30	0.00	0.00	860,257.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,494,936.72	0.00	0.00	12,494,936.72	0.00	0.00	
15,370,676.87	0.00	0.00	15,370,676.87	0.00	0.00	1,035,093.79	0.00	0.00	1,035,093.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,335,583.08	0.00	0.00	14,335,583.08	0.00	0.00
72,314,332.37	0.00	0.00	72,314,332.37	0.00	0.00	8,617,322.59	0.00	0.00	8,617,322.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,697,009.78	0.00	0.00	63,697,009.78	0.00	0.00



JULEN REMENTERIA DEL PUERTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C.P. JESUS SUVERZA MEDINA
 CONTRALOR MUNICIPAL



C.P.C. ANALOREN OBISPEZA TALAVERA
 TESORERO MUNICIPAL
